




Straßen- und Kanalbau Hauptstraße zwischen Blankeneser Chaussee und Autal Kreisel

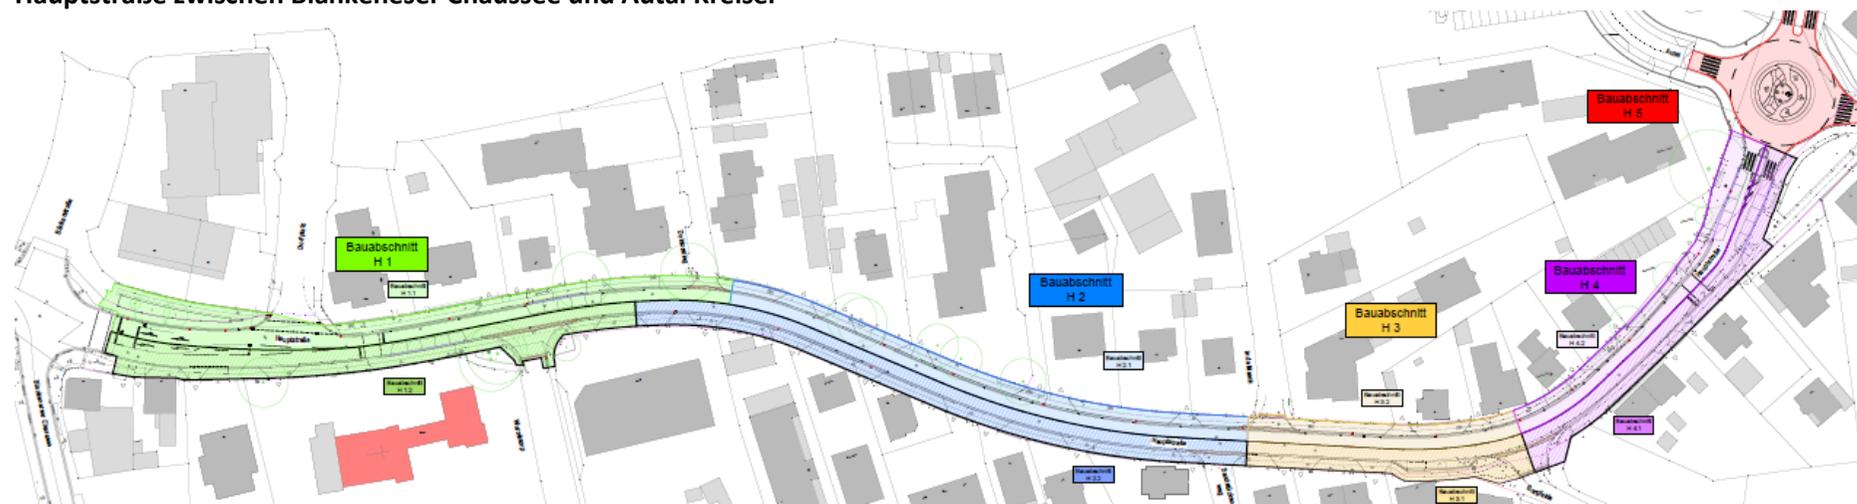

Voraussichtlich am 11. September 2025 werden die Arbeiten zur Sanierung der Hauptstraße beginnen. Die aktuelle Planung sieht eine Fertigstellung bis zum 30. September 2026 vor. Während dieses Zeitraums werden auch Sanierungsarbeiten in der Stettiner Straße und dem Kykerweg stattfinden. Sämtliche Arbeiten sollen so aufeinander abgestimmt werden, dass die zu erwartenden Beeinträchtigungen für die Anlieger möglichst gering bleiben.

Die Sanierung der Hauptstraße wird in 5 Bauabschnitten erfolgen. Innerhalb eines Bauabschnitts werden die Sanierungsarbeiten jeweils halbseitig ausgeführt. Während der gesamten Bauzeit wird die Hauptstraße für Fußgänger/-innen und Radfahrer/-innen nutzbar sein. Für den motorisierten Kraftfahrzeugverkehr wird die Hauptstraße aus Richtung Autal Kreisel als Einbahnstraße befahrbar bleiben. Die Auswirkungen auf den ÖPNV sind in dem nachfolgenden Lageplan dargestellt.

Einen Terminplan für die Ausführung der Sanierungsarbeiten in der Stettiner Straße und dem Kykerweg gibt es noch nicht. Diese Arbeiten werden frühestens nach Fertigstellung des 1. Bauabschnitts der Hauptstraße beginnen.


Kontakt

Ingenieurbüro Dänekamp und Partner, Herr Menger, Tel 04101 / 6992 – 0 oder info@daenekamp.de
Stadt Schenefeld, Herr Bothing, Tel. 040 / 83037 – 161 oder rathaus@stadt-schenefeld.de

Zeichenerklärung:

	Bauabschnitt H 1.1 / Bauzeit: 7 Wochen
	Bauabschnitt H 1.2 / Bauzeit: 6 Wochen
	Bauabschnitt H 2.1 / Bauzeit: 8 Wochen
	Bauabschnitt H 2.2 / Bauzeit: 8 Wochen
	Bauabschnitt H 3.1 / Bauzeit: 3 Wochen
	Bauabschnitt H 3.2 / Bauzeit: 5 Wochen
	Bauabschnitt H 4.1 / Bauzeit: 7 Wochen
	Bauabschnitt H 4.2 / Bauzeit: 6 Wochen
	Bauabschnitt H 5 / Bauzeit: 1 Woche

Grundsätzliche Planung ÖPNV

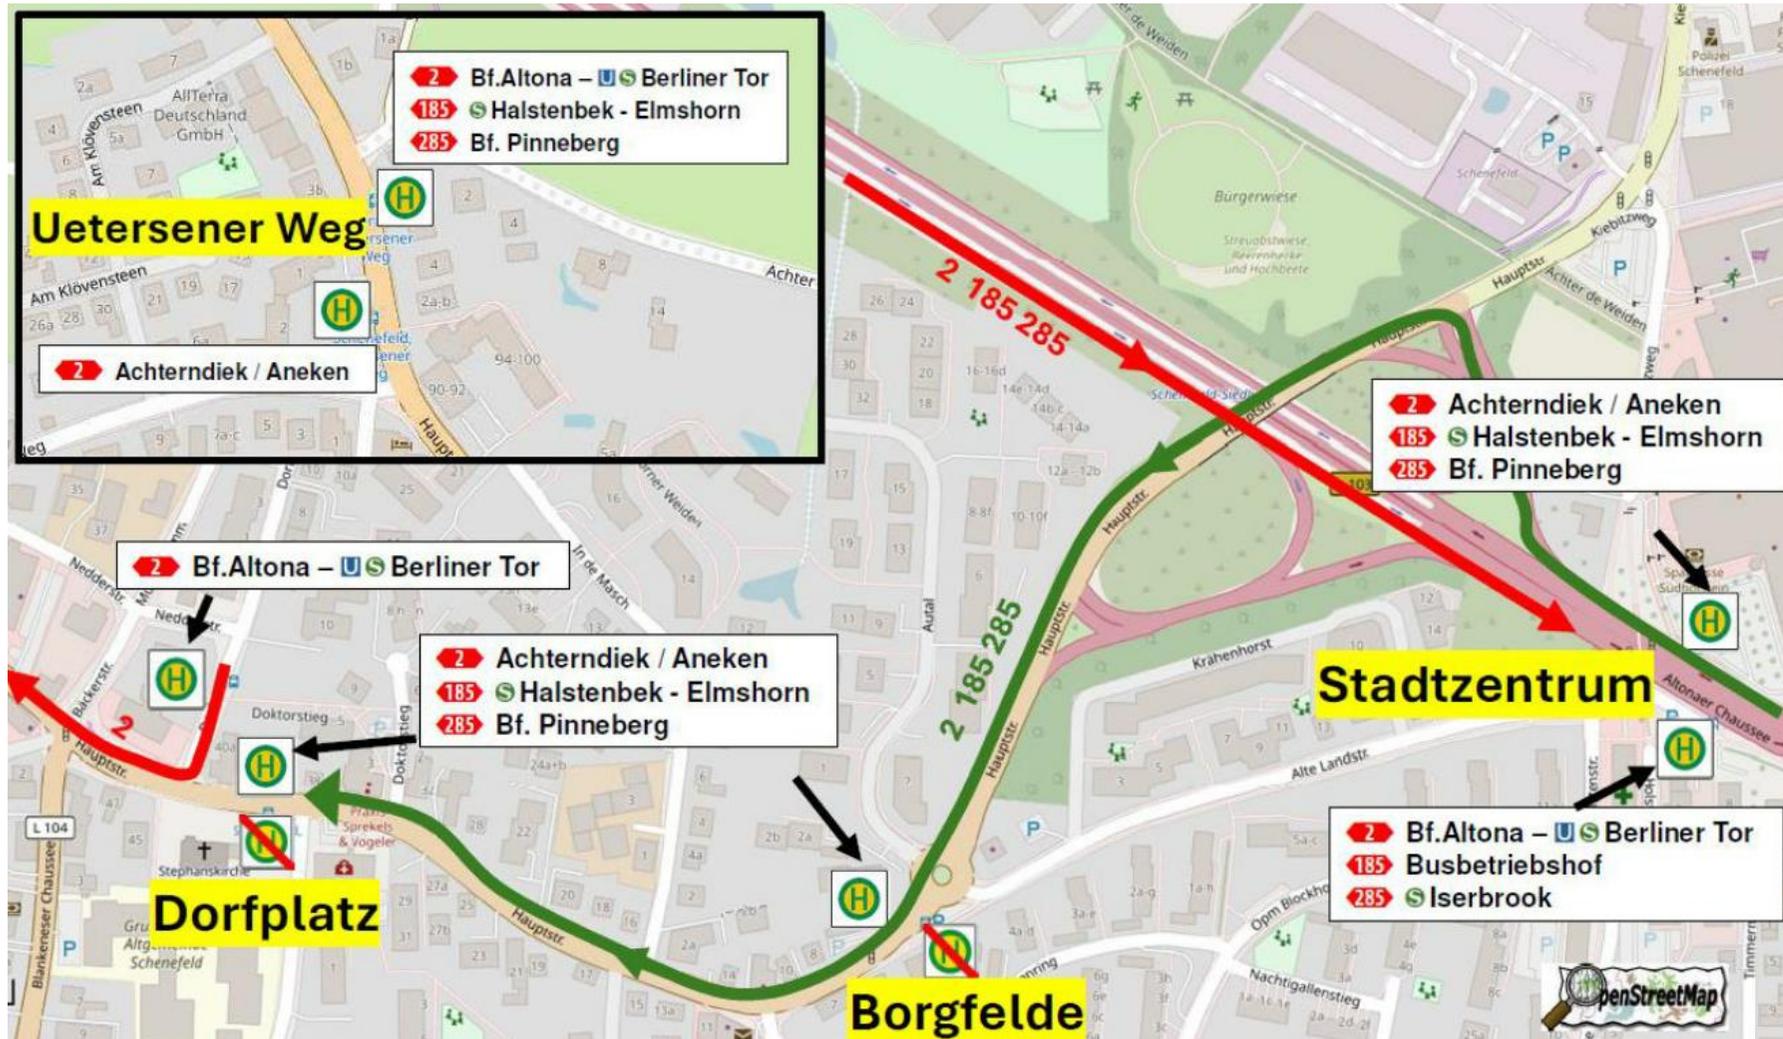

Kurzfristige Änderungen in Abhängigkeit der Bautätigkeit möglich. Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge an den Haltestellen.
