Datei: Bauzeitenplan Hauptstraße, Kykerweg, Stettiner Straße
Projektnummer: SCH24002

Projektzeitenplan
Bauzeitenplan Hauptstraße, Kykerweg, Stettiner Straße

d+p dänekamp und partner
BERATENDE INGENIEURE VBI

Nr	Name	Anfang	Ende
1	Hauptstraße	40. KW	42. KW
1.1	Bauabschnitt H 1.1	40. KW	47. KW
1.2	Bauabschnitt H 1.2	47. KW	51. KW
1.3	Winterpause (Witterungsbedingt)	52. KW	8. KW
1.4	Bauabschnitt H 1.2	9. KW	13. KW
1.5	Bauabschnitt H 2.1	14. KW	21. KW
1.6	Bauabschnitt H 2.2	22. KW	26. KW
1.7	Bauabschnitt H 3.1	26. KW	31. KW
1.8	Bauabschnitt H 3.2	32. KW	36. KW
1.9	Teilsperrung H 4.1	36. KW	38. KW
1.10	Teilsperrung H 4.2	39. KW	41. KW
1.11	Bauabschnitt H 5 Kreisverkehr	41. KW	42. KW
1.12	Vollsperrung (Asphaltarbeiten)	42. KW	42. KW
2	Kykerweg	45. KW	31. KW
2.1	Bauabschnitt K 3	45. KW	51. KW
2.2	Winterpause (Witterungsbedingt)	52. KW	8. KW
2.3	Bauabschnitt K 3	9. KW	17. KW
2.4	Bauabschnitt K 2	17. KW	24. KW
2.5	Bauabschnitt K 1	25. KW	31. KW
3	Stettiner Straße	22. KW	27. KW
3.1	Bauabschnitt S 1	22. KW	27. KW

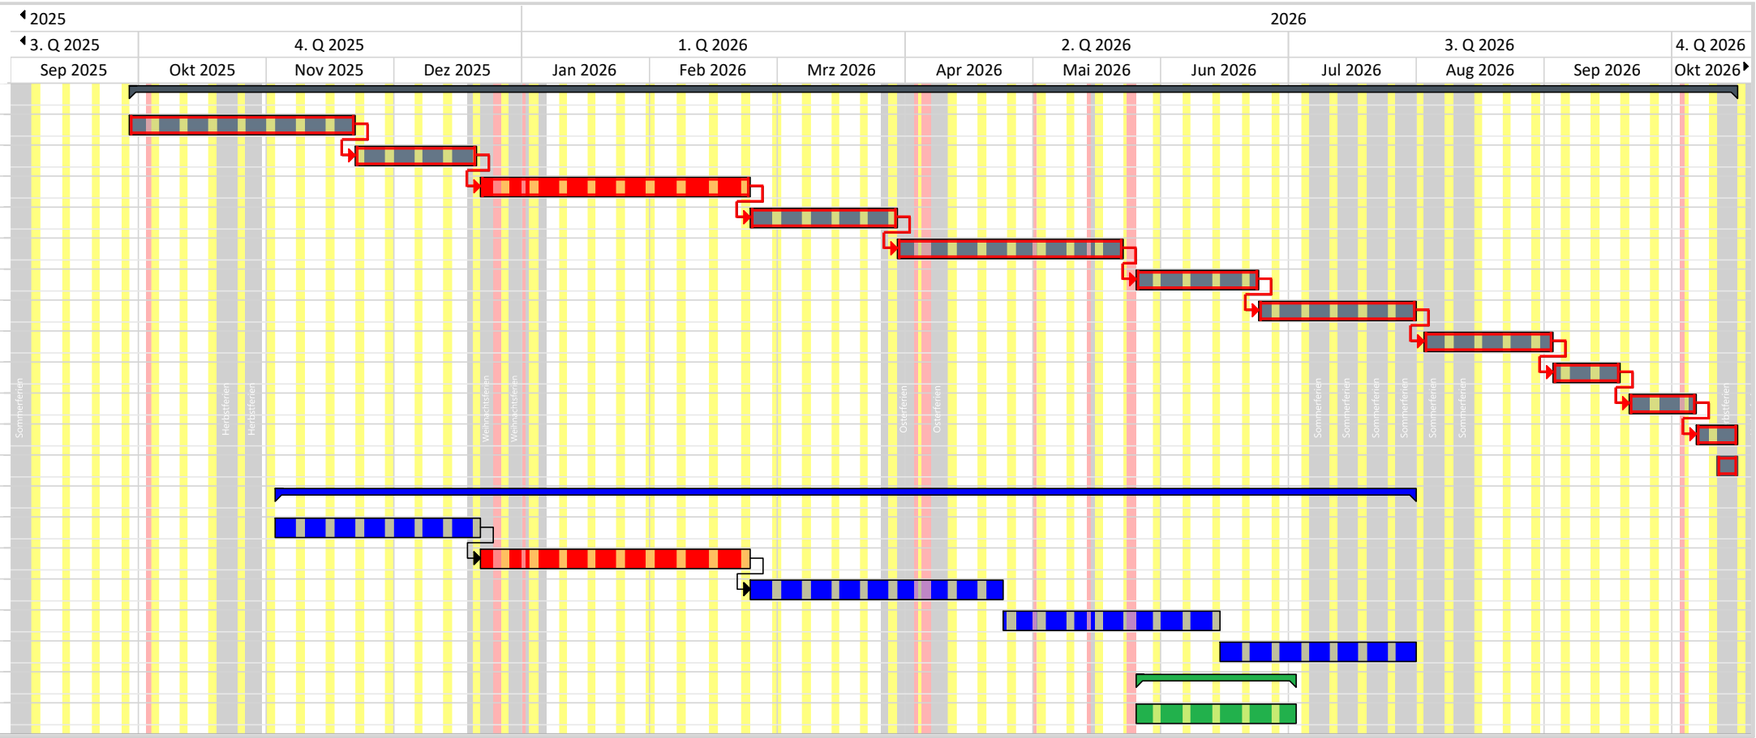

Bearbeiter: A. Menger

13.05.2026
